



# Proyecto de modernización de la red de calidad del aire de Ciudad Juárez





Desfase  
COVID  
15 días

✓	● 0. Firma de contrato	12/2/20	12/2/20
✓	● 1.0 Selección de equipo	7/27/20	8/31/20
▼	● 2.0 Reubicación de estaciones	9/1/20	3/5/21
▼	● 2.1 Remplazar estación Advance	9/1/20	2/12/21
✓	● 2.1.1 Firma de comodato INTERMEX	9/1/20	10/13/20
✓	● 2.1.2 Construcción nuevo remolque	11/23/20	11/27/20
	● 2.1.3 Instalar remolque	1/25/21	2/12/21
▼	● 2.2 Reubicación de estación Delphi	12/11/20	3/5/21
✓	● 2.2.1 Proyecto Ejecutivo de mejoras	12/11/20	1/8/21
	● 2.2.2 Instalación de remolque	2/15/21	3/5/21
	● 3.0 Plan de sistema de comunicación	3/8/21	3/19/21
▼	● 4.0 Actualización de equipos	12/14/20	4/28/21
✓	● 4.1 Orden de compra y fabricación	12/14/20	3/12/21
	● 4.2 Entrega y puesta en forma	4/1/21	4/28/21
	● 5.0 Operación, mantenimiento, QA	4/28/21	12/2/21
	● 6.0 Talleres técnicos y presentaciones	12/2/20	12/2/21

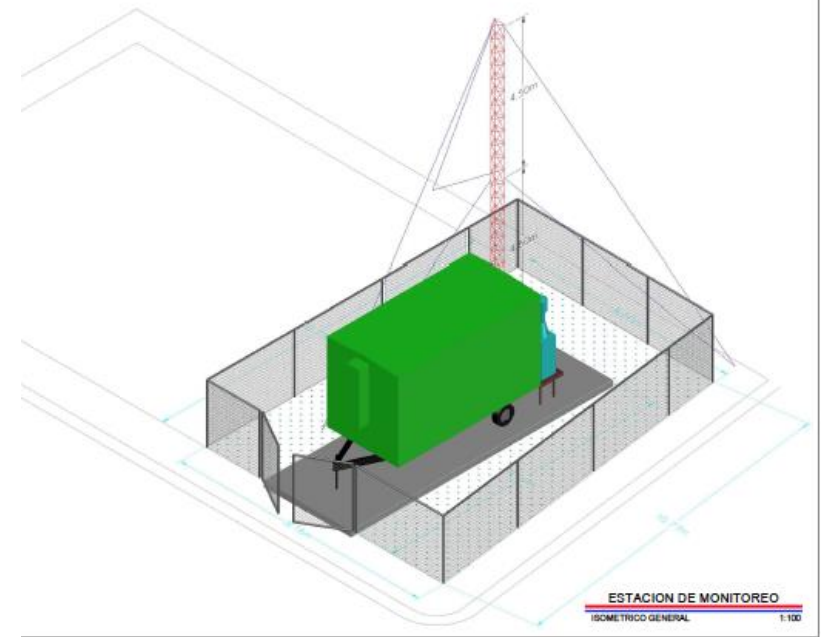

**UBICACIÓN**  
MAPA SIN ESCALA



Se adquiere caseta nueva para el sitio Advance Transformer  
Se repara y traslada caseta de estación Delphi

## Resumen a la fecha

Se ordenan y están en fabricación 3 analizadores de ozono

Se autoriza la adquisición de 2 torres meteorológicas

Se autorizan las adecuaciones en PTAR-Norte

Se adquieren 3 estaciones meteorológicas Met-One

# Fecha promesa para 1 de mayo de 2021

---

Gracias



**Dr. Felipe Adrián Vázquez Gálvez**  
COORDINADOR DEL CECATEV

CENTRO DE CIENCIAS ATMOSFÉRICAS Y  
TECNOLOGÍAS VERDES  
TEL. 6884800 EXT. 4947  
UACJ IIT EDIFICIO E-201
